



Průběžná evaluace implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Průběžná zpráva 01 – Manažerské shrnutí

prosinec 2016

Finální verze



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Manažerské shrnutí



Věcný pokrok vzhledem ke stavu implementace částečně odpovídá očekávanému stavu realizace OP VVV.

Plnění reálných hodnot indikátorů výsledku a výstupu daných programovým dokumentem bylo k 30. 6. 2016 jednotně nulové. Pouze pro 18 z celkových 78 programových indikátorů byly ve sledovaném období stanoveny závazky na úrovni projektů. Výzvy dostupné v MS2014+ pokrývaly celkem 68 vyhlášených programových indikátorů. K danému datu nebylo výzvami pokryto celkem 10 programových indikátorů, a to především z PO3.



Reálné hodnoty indikátorů výsledku a výstupu byly ke konci sledovaného období (30. 6. 2016) nulové. Skutečný příspěvek projektů ke zlepšení stavu v prostředí českého školství a VaV proto zatím nelze hodnotit.

Vzhledem k nulovým hodnotám indikátorů nelze v této Průběžné zprávě hodnotit věcný pokrok OP VVV, kterého bylo dosaženo realizací projektů. Zpráva proto predikuje plnění cílových hodnot indikátorů a jejich milníků prostřednictvím cílových hodnot indikátorů ve vyhlášených výzvách a cílových hodnot indikátorů, ke kterým se zavazují žadatelé a příjemci finanční podpory OP VVV.



Byly identifikovány cílové hodnoty a milníky indikátorů, u kterých existuje riziko jejich nenaplnění.

Aktuální úroveň potenciálu k naplnění cílových hodnot je ve většině případů považována za dostatečnou. **Riziko nenaplnění cílových hodnot bylo identifikováno u následujících indikátorů:**

Tabulka 1 Manažerské shrnutí – riziko nenaplnění hodnot indikátorů

PO / IP	Indikátor	Popis rizika nenaplnění
PO1 IP1	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Byla provedena nová analýza absorpční kapacity, která odhaduje možnost naplnění hodnoty indikátoru na 35. Na tuto hodnotu cílí i výzva 02_16_026. Další výzvy plánovány nejsou. Pokud MŠMT neuvažuje o vyhlášení dalších výzev, považujeme za vhodné snížit cílovou hodnotou indikátoru z 200 na 35.
PO1 IP1	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na nepřesných předpokladech. Po upřesnění těchto předpokladů se navrhuje snížit cílovou hodnotu indikátoru na 1 800. Stejně tak je nutné snížit i cílovou hodnotu indikátoru ve výzvě 02_16_017.
PO2 IP1	Celkový počet účastníků	V tomto indikátoru se vykazují tytéž osoby, jako v ostatních indikátorech podpořených osob, a to v okamžiku, kdy délka jejich podpory překročí hranici bagatelní podpory. MŠMT aktuálně provádí



PO / IP	Indikátor	Popis rizika nenaplnění
		revizi předpokladů a výpočtu hodnot jednotlivých indikátorů podpořených osob. Po této revizi doporučujeme provést i revizi cílové hodnoty předmětného indikátoru. V návaznosti na prováděné revize se očekává nutnost snížení cílové hodnoty (včetně milníků) předmětného indikátoru.

Na základě relativně vysokého pokrytí cílové hodnoty indikátoru výzvami (vyšší než 50 %) bylo u následujících indikátorů identifikováno riziko přeplnění cílových hodnot:

Tabulka 2 Manažerské shrnutí – riziko přeplnění hodnot indikátorů

PO / IP	Indikátor	Míra pokrytí cílové hodnoty indikátoru výzvami
PO1 IP1	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a Center excellence	83 %
PO1 IP1	Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVal	83 %
PO2 IP1	Počet nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programů akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce	267 %
PO2 IP1	Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni	N/A*
PO2 IP2	Podíl studentů se SP k počtu studentů	188 %
PO2 IP1	Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce	90 %
PO3 IP3	Počet produktů v systémových projektech	1 780 %
PO3 IP3	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí	831 %
PO3 IP2	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí	273 %
PO3 IP3	Počet podpořených produktů	238 %
PO3 IP2	Počet produktů v systémových projektech	216 %
PO3 IP1	Počet podpořených spoluprací	100 %
PO3 IP1	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí	88 %
PO3 IP1	Počet produktů v systémových projektech	70 %
PO3 IP3	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti	59 %

*MŠMT reviduje interpretaci indikátoru, která může být duplicitní s indikátorem 5 43 01. Po revizi interpretace, kterou MŠMT navrhuje, lze očekávat přeplnění cílové hodnoty indikátoru.

Na základě analýzy bylo navrženo odstranění indikátoru výsledku Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, protože intervence OP VVV v PO2 nejsou zaměřeny na systémové změny.

Naplnění milníků výstupových indikátorů výkonnostního rámce je považováno za rizikové u těchto indikátorů:

Tabulka 3 Manažerské shrnutí – riziko nesplnění milníků 2018

PO	Indikátor
PO1	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence
PO2	Celkový počet účastníků
PO2	Pořízené informační zdroje
PO3	Celkový počet účastníků

Byly identifikovány některé indikátory, u kterých je stanovení cílových hodnot a hodnot milníků považováno za nepřesné (týká se indikátorů EFRR PO1 a EFRR a ESF PO2 a indikátorů PO3). U těchto indikátorů se doporučuje vyjednat s Evropskou komisí nastavení nových hodnot, které budou založeny na zpřesněných a aktualizovaných informacích, případně



realizovat další opatření jako zrychlení schvalování projektů nebo vyhlášení dodatečných výzev, které by měly za úkol hodnoty indikátorů naplnit.



Finanční pokrok částečně odpovídá očekávanému stavu realizace OP VVV k rozhodnému datu a zejména skutečnosti, že k 30. 6. 2016 nebyla ještě zahájena realizace většiny projektů.

V PO3 bylo identifikováno riziko relativně nízkého čerpání u výzev 02_16_022 a 02_16_023, které může ohrožovat plnění finančního milníku. Úroveň finančního plnění OP VVV dle fondů je zobrazeno v následující tabulce.

Tabulka 4 Finanční plnění dle fondů

Prioritní osa	Fond	Podíl alokace výzev k Alokaci OP VVV	Podíl objemu závazkovaných prostředků k Alokaci OP VVV	Podíl objemu proplacených prostředků k Alokaci OP VVV
PO1	EFRR	81,93 %	7,78 %	1,82 %
PO2	EFRR	68,81 %	0,00 %	0,00 %
	ESF	55,06 %	0,00 %	0,00 %
	EFRR+ESF	62,59 %	0,00 %	0,00 %
PO3	ESF	44,83 %	5,38 %	0,63 %
PO4	EFRR	37,23 %	25,81 %	1,27 %
Celkem	EFRR	75,41 %	6,71 %	1,27 %
	ESF	47,78 %	3,82 %	0,45 %
	EFRR+ESF	63,06 %	5,42 %	0,90 %




Byly identifikovány faktory, které mohou závažným způsobem bránit efektivní implementaci OP VVV.

Identifikované faktory, které v současnosti negativně ovlivňují pokrok implementace programu, jsou uvedeny na následujícím obrázku. Faktory jsou na obrázku dle teploměru rozděleny na nejvíce závažné, středně závažné a nejméně závažné.



Obrázek 1 Faktory ovlivňující stav implementace programu

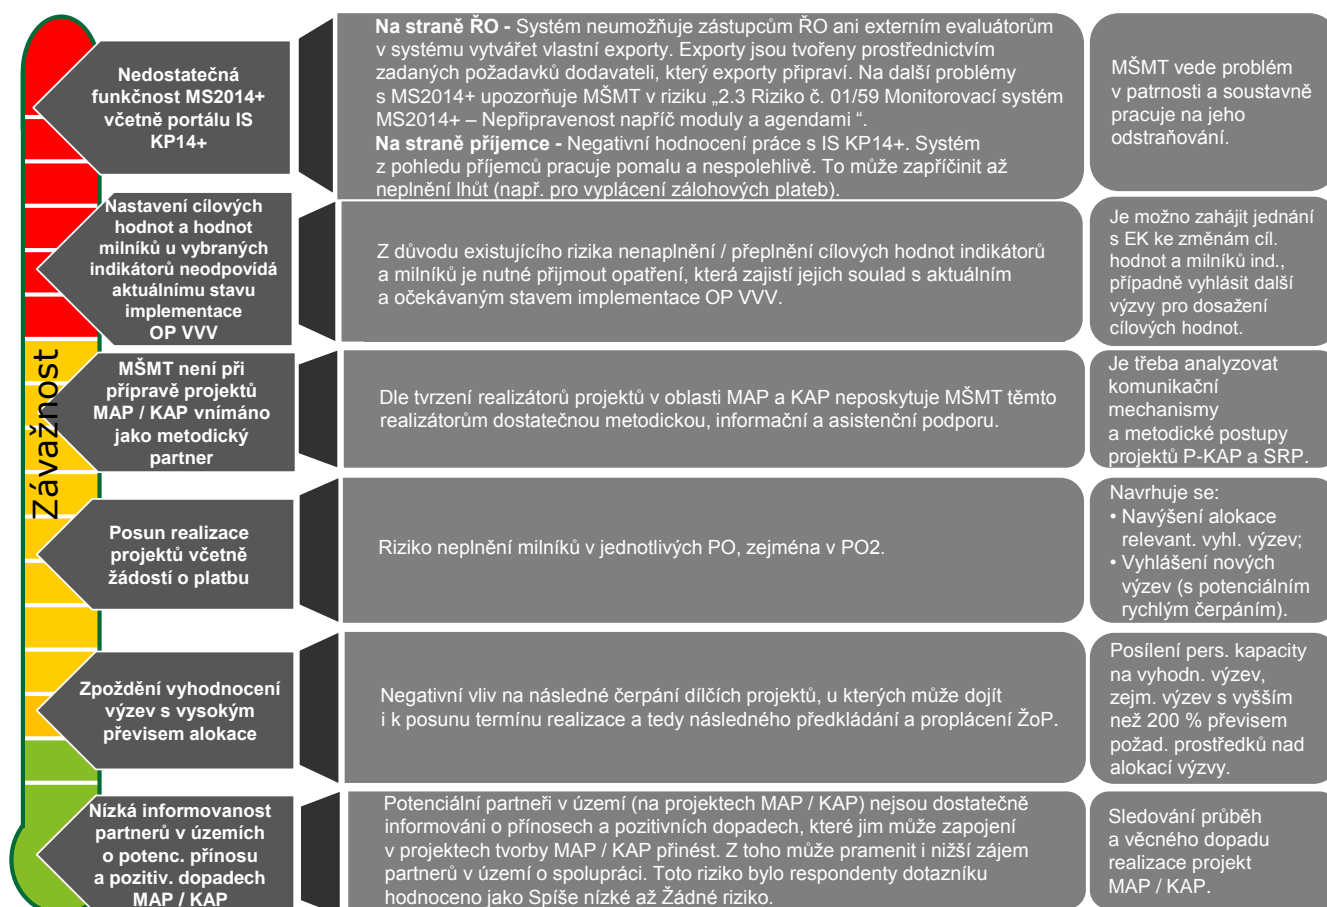

Vzhledem ke stavu implementace nelze aktuálně identifikovat konkrétní SC s rizikem nedočerpání. Obecně existuje riziko nedodržení finančních cílů pro rok 2018 v rámci prioritní osy 2 (v případě obou fondů ESF i EFRR) a hrozí tedy i nenaplnění finančních ukazatelů výkonnostního rámce PO2.



Systém zjišťování absorpční kapacity potenciálních žadatelů je funkční. Ve většině výzev naopak existuje významný převis požadovaných finančních prostředků oproti alokaci výzvy.

Na základě provedených analýz byl vytvořen následující soubor doporučení. Tato doporučení jsou na obrázku dle teploměru rozdělena na nejvíce závažná, středně závažná a nejméně závažná.



Obrázek 2 Doporučení plynoucí ze zjištění

